



OBRAS EN EL DIQUE NORTE Y CERRAMIENTO SUR DEL PUERTO DE GANDÍA

DATOS DEL CONTRATO

DATOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE CONTRATO:

Asistencia técnica y Coordinación de Seguridad y Salud

NOMBRE DEL CONTRATO:

Asistencia técnica y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de "Construcción del nuevo cerramiento perimetral de la zona sur y del refuerzo de la escollera e instalación de fibra óptica en el Dique Norte del puerto de Gandía"

LOCALIZACIÓN: Gandía (Valencia)**PRESUPUESTO:** 42.521,25 €**PRESUPUESTO DE LA OBRA:** 744.459 €**CLIENTE:** AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA**FECHA (INICIO-FIN):** Febrero 2015 – Junio 2015

DATOS TÉCNICOS

CERRAMIENTO:

- Valla de perfiles metálicos	119.799,50 €
- Canalización comunicaciones	19.813,60 €
- Muro de HA-30/B/20/IIIa	38.823,84 €
- Arquetas de registro	7.840,00 €

ESCOLLERA DIQUE NORTE:

- Escollera de 6T	154.725,95 €
- Recolocación escollera	121.355,89 €
- Desmontaje escollera	4.140,00 €
- Reposición y repavimentación	21.500,00 €

RED FIBRA ÓPTICA:

- Tendido fibra submarina	40.673,77 €
- Arquetas registro	14.146,38 €
- Canalización servicios	8.665,35 €
- Hormigón pavimento	6.416,60 €

OBJETO DE LA ACTUACIÓN

El objeto de la actuación es la realización del control y vigilancia de la obra civil, garantizando que las mismas se ejecutan de acuerdo con las previsiones del Proyecto y conforme a la normativa.

Desempeñar las labores establecidas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, incluyendo la revisión previa del Plan de Seguridad y Salud con la redacción del informe de correcciones al mismo, el informe favorable del Plan, y el seguimiento de los trabajos mediante visitas de seguimiento a las obras, con la elaboración del informe de visita.

TAREAS DESARROLLADAS

- Control Geométrico
- Control Económico
- Control de Calidad de los Materiales
- Cálculos técnicos necesarios durante la marcha
- Informe mensuales
- Control de la seguridad y salud en la obra
- Proyecto de Liquidación de las obras
- Revisión de precios, cuando proceda

ESTADO PREVIO



Cerramiento Sur

ESTADO FINAL



Final de las Obras



CPS



DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El contrato como Asistencia técnica contiene 3 proyectos de construcción independientes que tienen por objeto:

1. Construcción de un cerramiento definitivo instalando un cerramiento mediante perfiles de acero sobre murete y pilares de hormigón y 2 puertas de acceso. También se incluirá una valla antiescalada de 3m de altura en la zona sureste.
2. Reconstrucción de la sección tipo del dique mediante escollera de 6T y recebo con escollera 50-100kg, incluyendo una plataforma de acceso y la repavimentación y reposición de servicios afectados.
3. Dotación de red de fibra óptica a la zona norte del puerto, incluyendo el tendido de más de 200m de fibra submarina, instalación de un rack de comunicaciones, equipaciones electrónicas y canalización por la que conducir la nueva red



Ejecución de cimentación del muro




Ejecución de pilares y muro de cerramiento



Estado inicial antes de la recolocación en talud



Estado final de la recolocación en talud de escollera

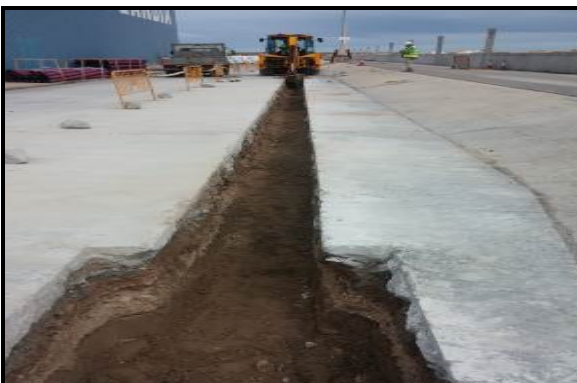

Ejecución de la zanja para la canalización



Tendido de la fibra submarina
